



COMUNE DI ACCIANO

Piazza Municipio n.1
67020 Acciano L'Aquila

Progetto:

**Interventi di ripristino Cimiteri Comunali del Capoluogo
e delle Frazioni danneggiati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009**

Il Tecnico Comunale
Ing. Salvatore Cifani

Progettazione:		e-mail:	
		donatosantilli@virgilio.it	
		Cell. 3667167271	
		Cod. Commessa:	
Data:		Scala:	Tavola: 27
01		Fase:	
02		Progetto esecutivo	
03			
Oggetto: CRONOPROGRAMMA		Controllato:	Riproduzione vietata, tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi.
		Note:	

ALLEGATO "A"

Comune di ACCIANO

Provincia di AQ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009

COMMITTENTE: COMUNE DI ACCIANO.

CANTIERE: CIMITERI DI ACCIANO, ACCIANO (AQ)

aCCIANO, 02/05/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Santilli Donato)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE CIFANI SALVATORE)

Ingegnere Santilli Donato

Via Simonetti snc
67020 Castel Di Ieri (AQ)
Tel.: 086479677 -
E-Mail: donatosantilli@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT


Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	7	9	26/07/2022	03/08/2022
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	9	14	04/08/2022	17/08/2022
	1	E	10	14	24/03/2023	06/04/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	5	18/08/2022	22/08/2022
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	23/08/2022	24/08/2022
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	5	25/08/2022	29/08/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	10	14	05/04/2023	18/04/2023
SCAVI						
Scavo a sezione obbligata	1	E	15	21	30/08/2022	19/09/2022
RIMOZIONE						
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	7	20/09/2022	26/09/2022
Rimozione di massetto	1	E	6	8	27/09/2022	04/10/2022
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	5	7	05/10/2022	11/10/2022
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	4	6	12/10/2022	17/10/2022
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	5	7	18/10/2022	24/10/2022
Rimozione di manto impermeabile	1	E	5	7	25/10/2022	31/10/2022
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	4	6	02/11/2022	07/11/2022
DEMOLIZIONI						
Taglio di muratura a tutto spessore	1	E	4	4	08/11/2022	11/11/2022
Svuotamento rinfianchi della volta	1	E	5	5	14/11/2022	18/11/2022
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	1	E	8	10	21/11/2022	30/11/2022
OPERE STRUTTURALI						
Getto in calcestruzzo travi sottfondali	1	E	18	28	01/12/2022	28/12/2022
Montaggio di travi in legno èper tetto	1	E	4	6	29/12/2022	03/01/2023
CONSOLIDAMENTO						
Cerchiatura di vani con profilo in acciaio	1	E	6	9	04/01/2023	12/01/2023
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata	1	E	7	11	13/01/2023	23/01/2023
Consolidamento di volta in muratura	1	E	7	9	24/01/2023	01/02/2023
OPERE IN COPERTURA						
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	4	6	02/02/2023	07/02/2023
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	3	3	08/02/2023	10/02/2023
Posa di manto di copertura in coppi	1	E	7	9	13/02/2023	21/02/2023
FINITURE						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	6	8	22/02/2023	01/03/2023
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	4	6	02/03/2023	07/03/2023
Posa di pavimenti per interni	1	E	7	9	08/03/2023	16/03/2023
Realizzazione controsoffitti	1	E	3	5	17/03/2023	21/03/2023
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	8	10	22/03/2023	31/03/2023

Tabella Analitica Gantt


Tinteggiatura di superfici interne	1	E	6	8	03/04/2023	10/04/2023
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>1) = nuovo...</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

Nome attività	Durata	18 Lug 22			25 Lug 22			01 Ago 22			08 Ago 22			15 Ago 22			22 Ago 22			29 Ago 22																							
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
Allestimento del cantiere	186 g	[Barra grigia con freccia rivolta verso il basso]																																									
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	7 g	Z1 [Barra blu]																																									
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	19 g	Z1 [Barra blu]																																									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1 [Barra blu]																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1 [Barra blu]																																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1 [Barra blu]																																									
Smobilizzo del cantiere	10 g																																										
SCAVI	15 g	[Barra grigia con freccia rivolta verso il basso]																																									
Scavo a sezione obbligata	15 g	Z1 [Barra blu]																																									
RIMOZIONE	34 g																																										
Rimozione di pavimenti interni	5 g																																										
Rimozione di massetto	6 g																																										
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g																																										
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g																																										
Rimozione di manto di copertura in tegole	5 g																																										
Rimozione di manto impermeabile	5 g																																										
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	4 g																																										
DEMOLIZIONI	17 g																																										
Taglio di muratura a tutto spessore	4 g																																										
Svuotamento rinfianchi della volta	5 g																																										
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	8 g																																										
OPERE STRUTTURALI	22 g																																										

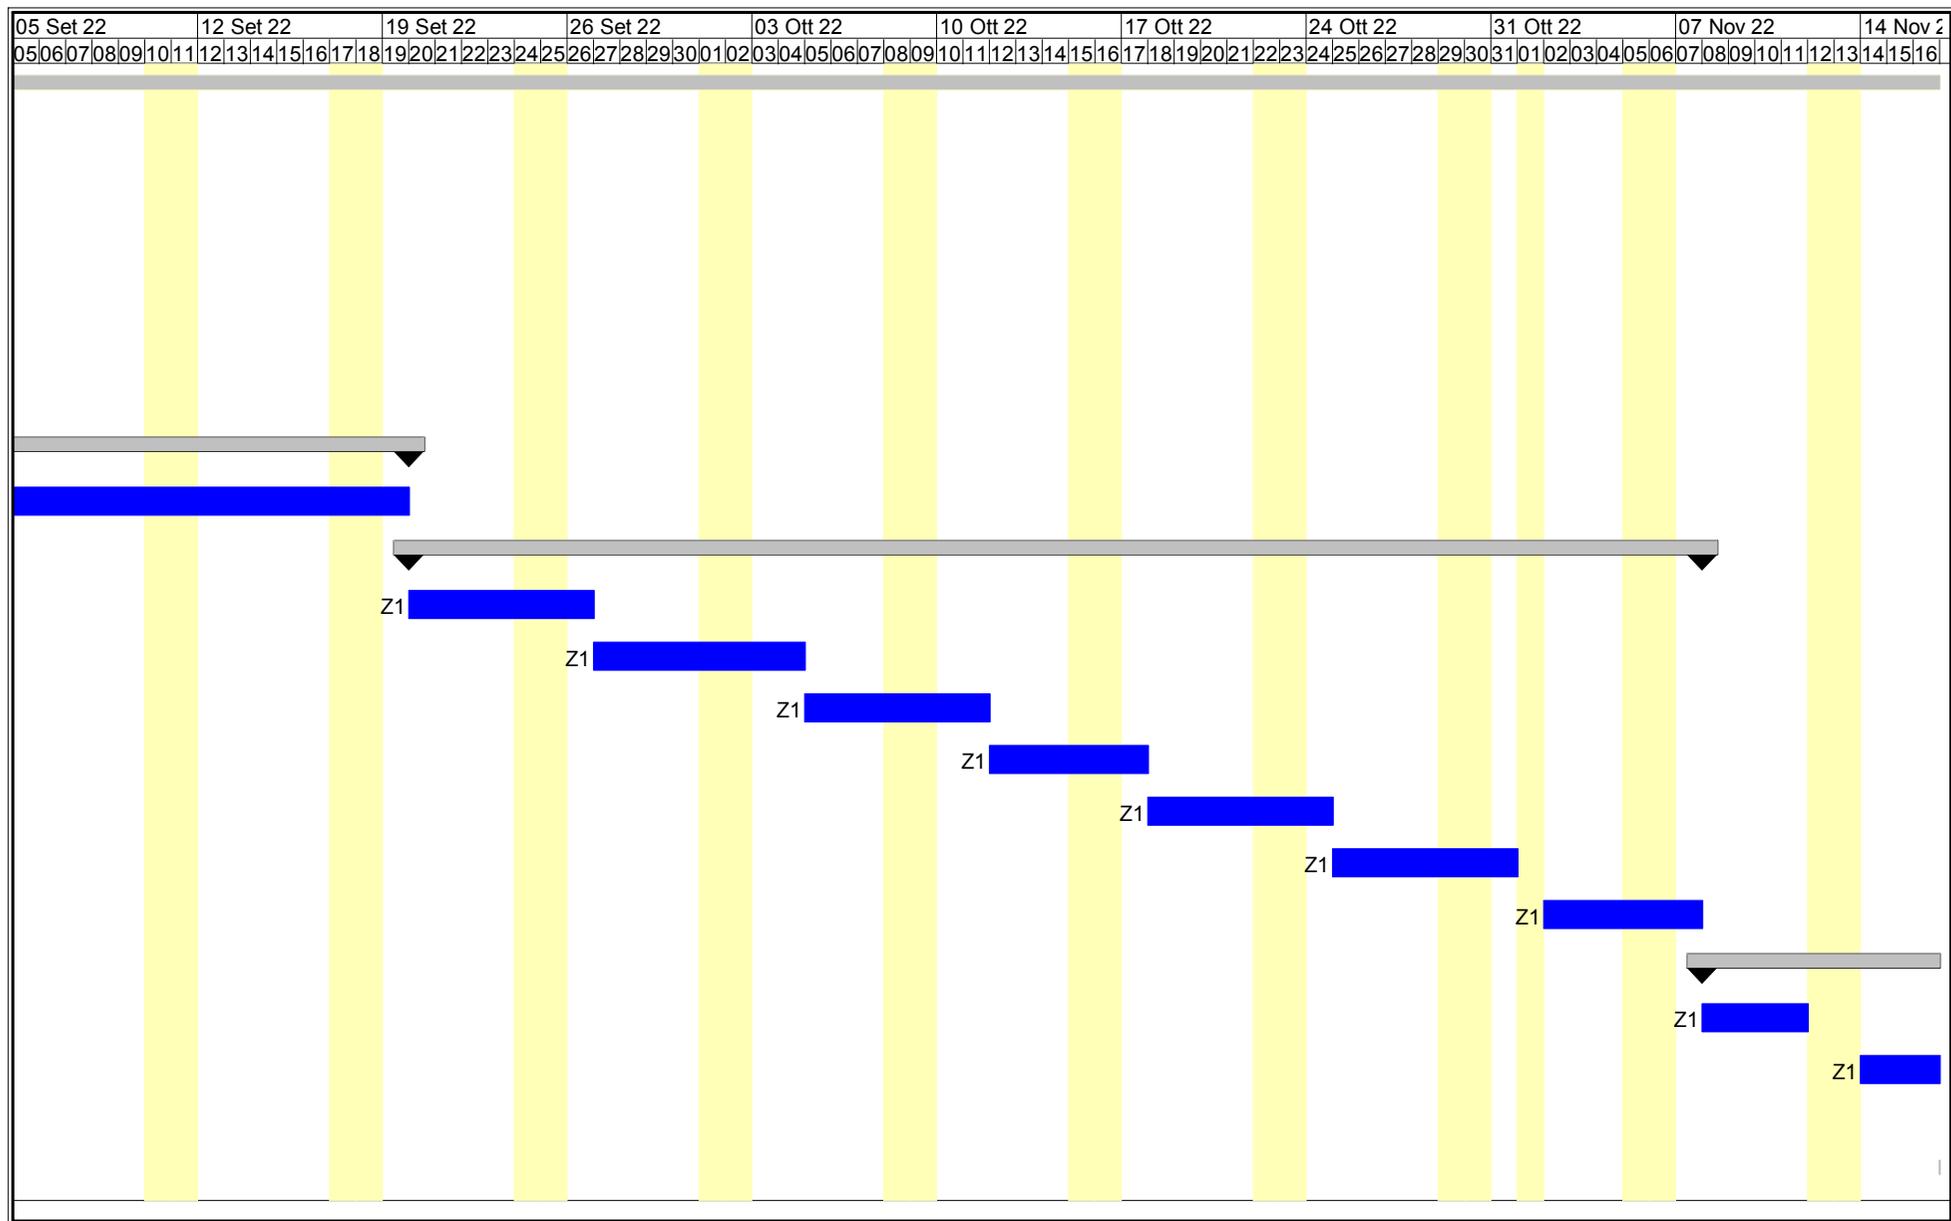



05 Set 22				12 Set 22				19 Set 22				26 Set 22				03 Ott 22				10 Ott 22				17 Ott 22				24 Ott 22				31 Ott 22				07 Nov 22				14 Nov 22																																
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16


14 Nov

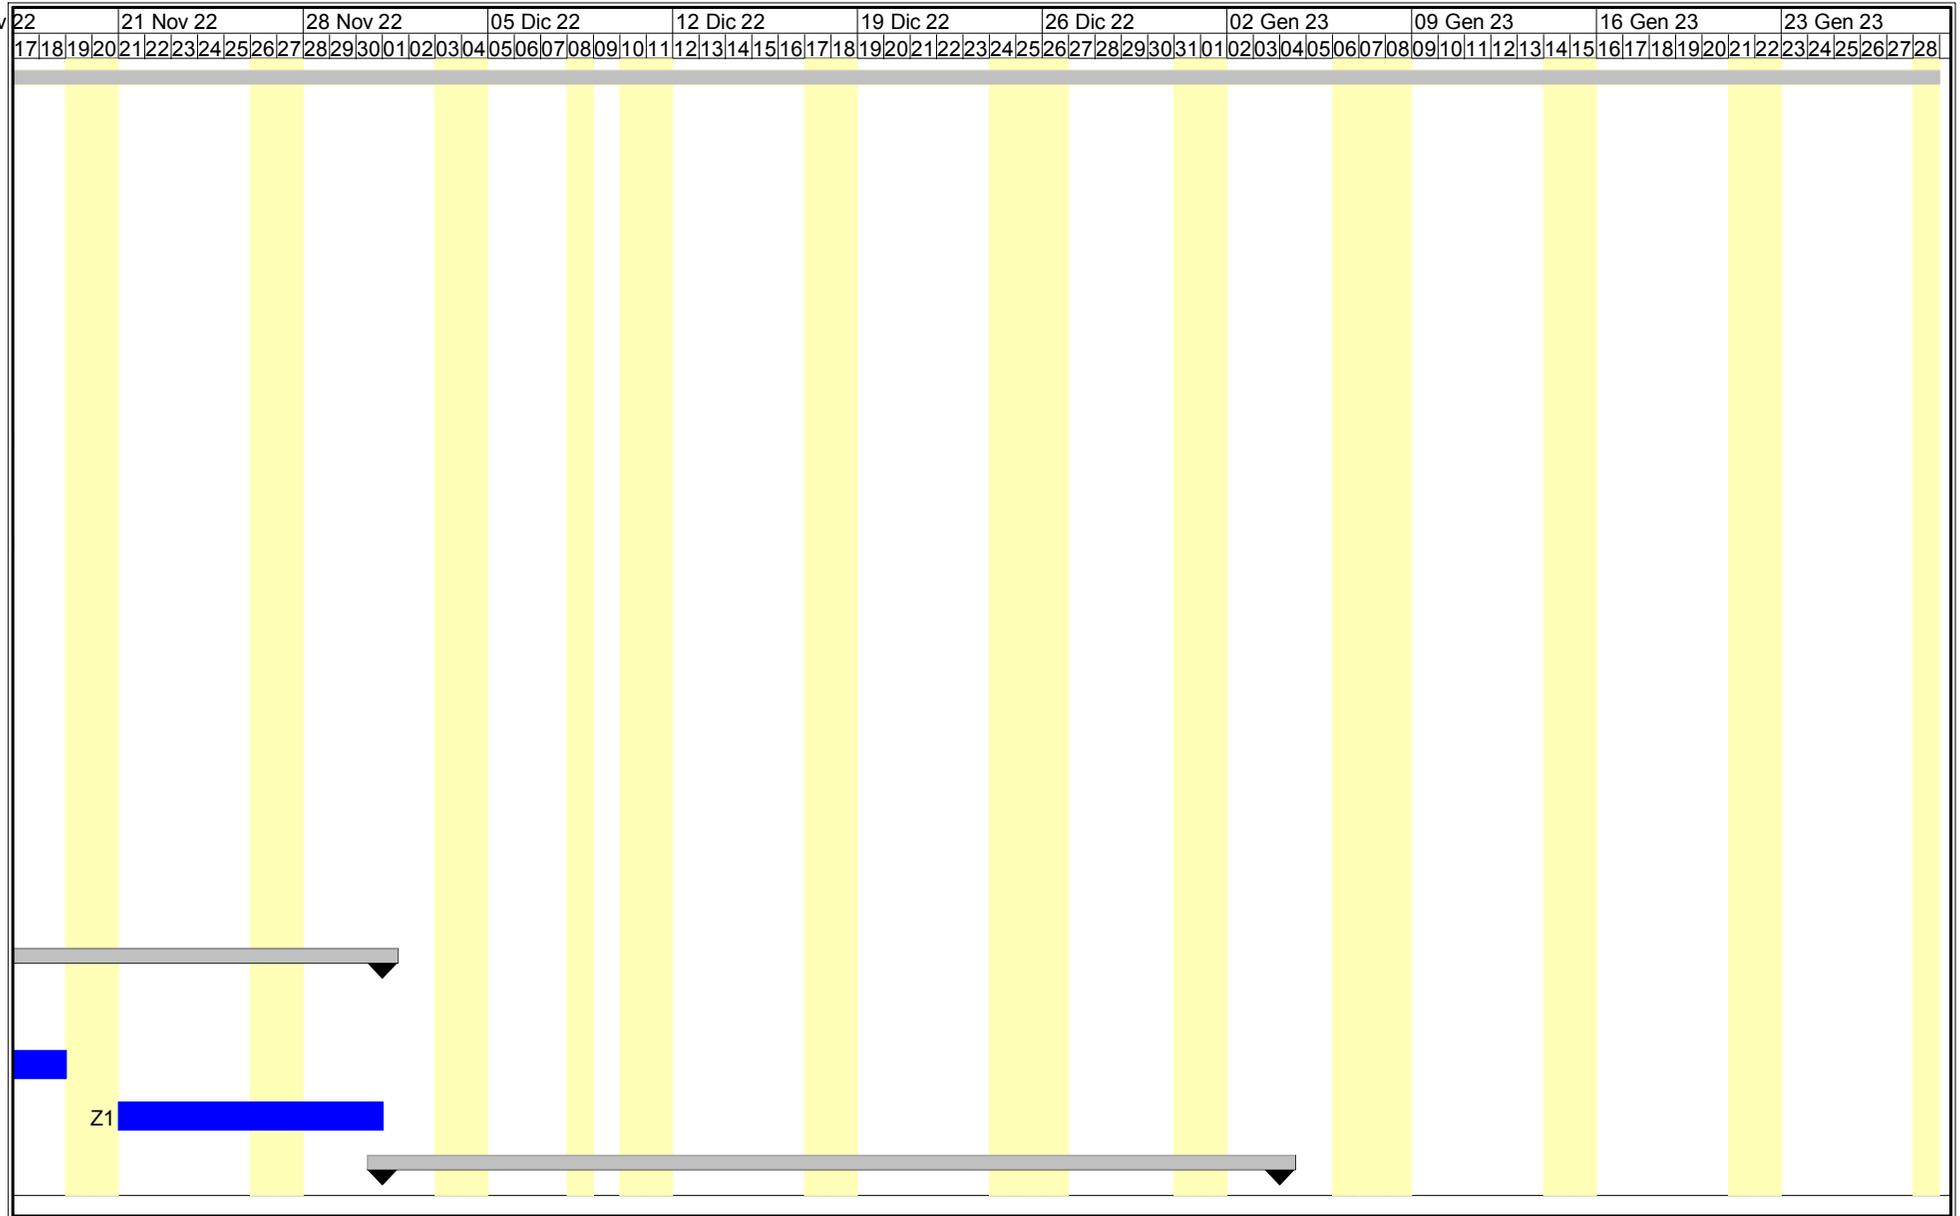


14 Nov

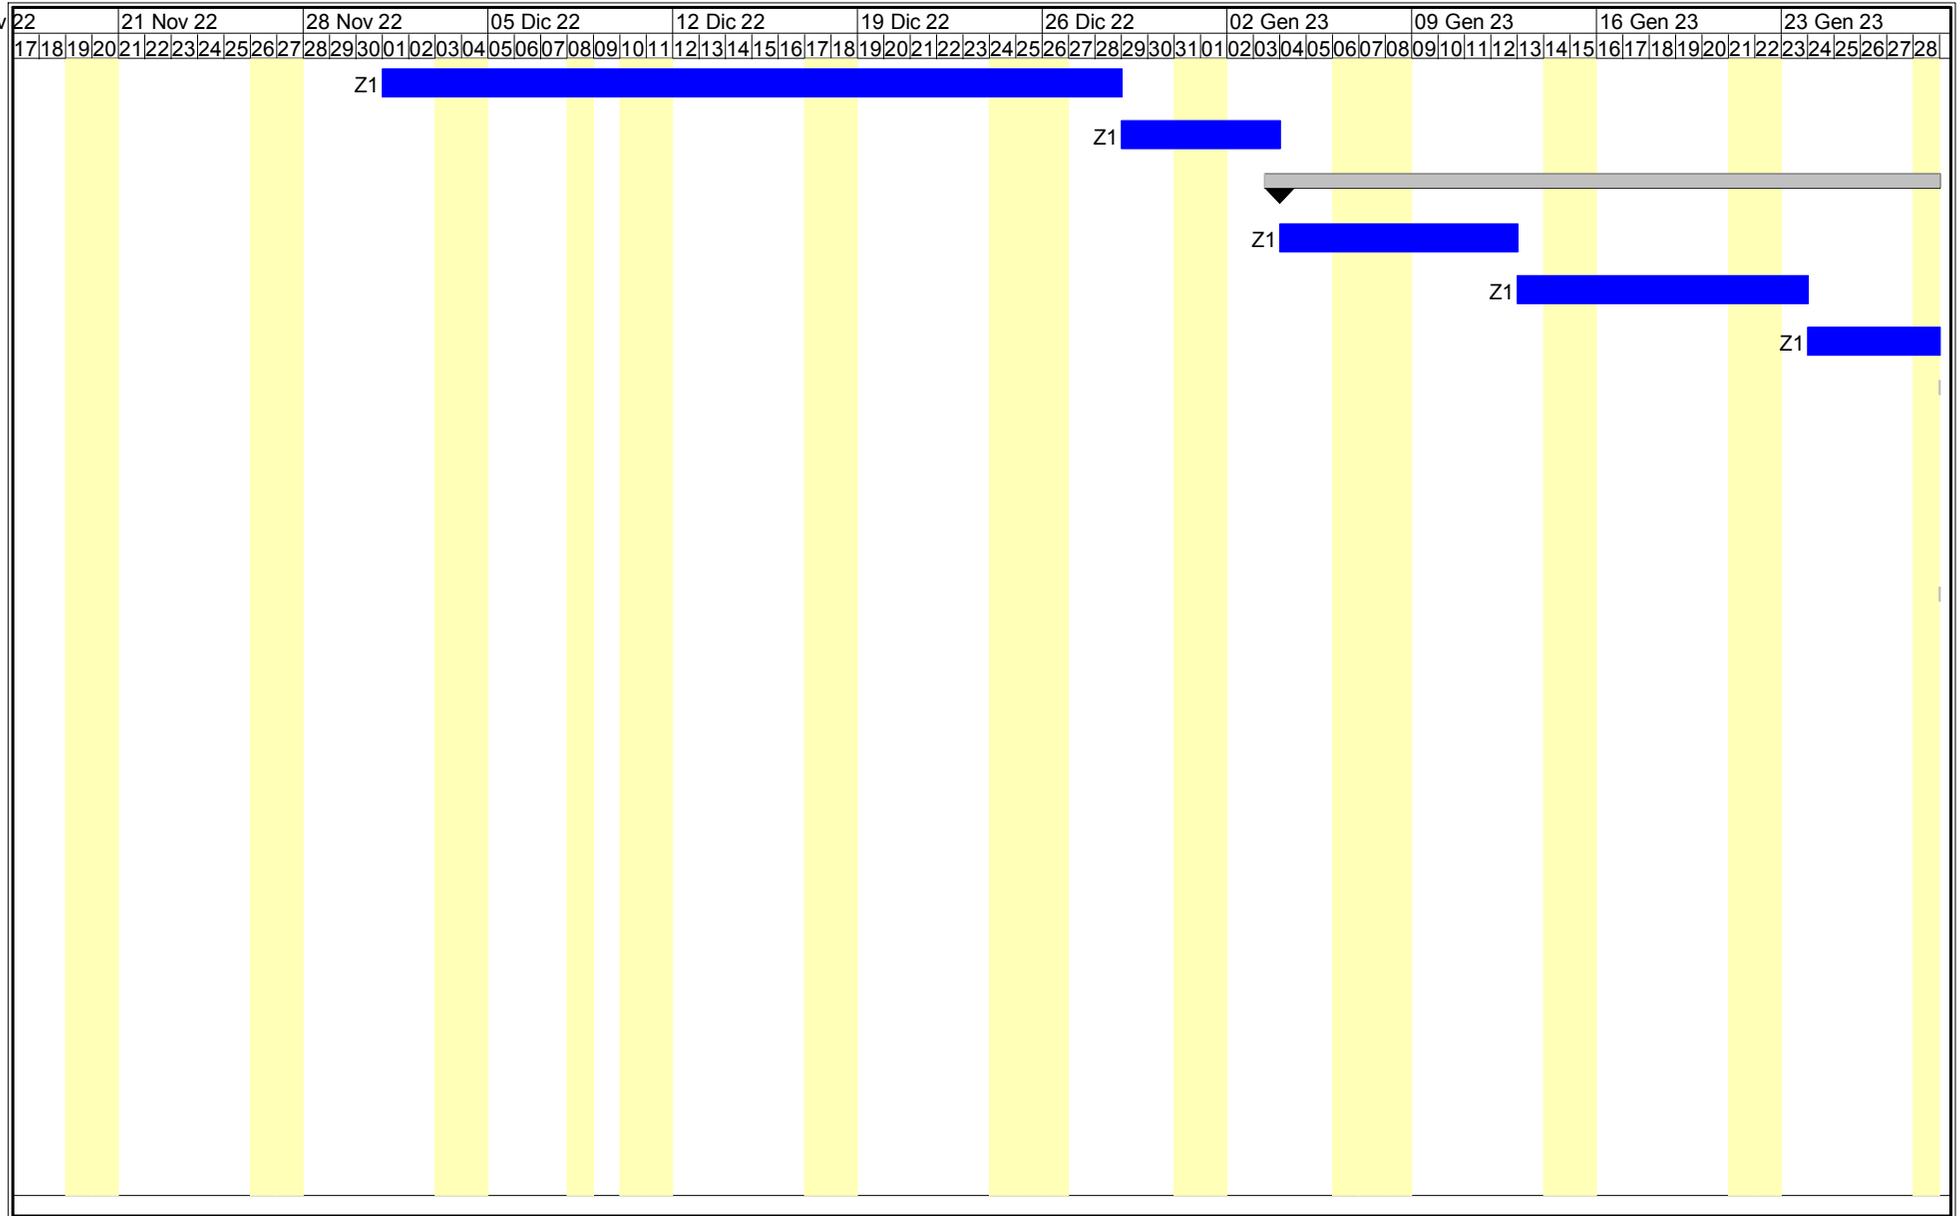

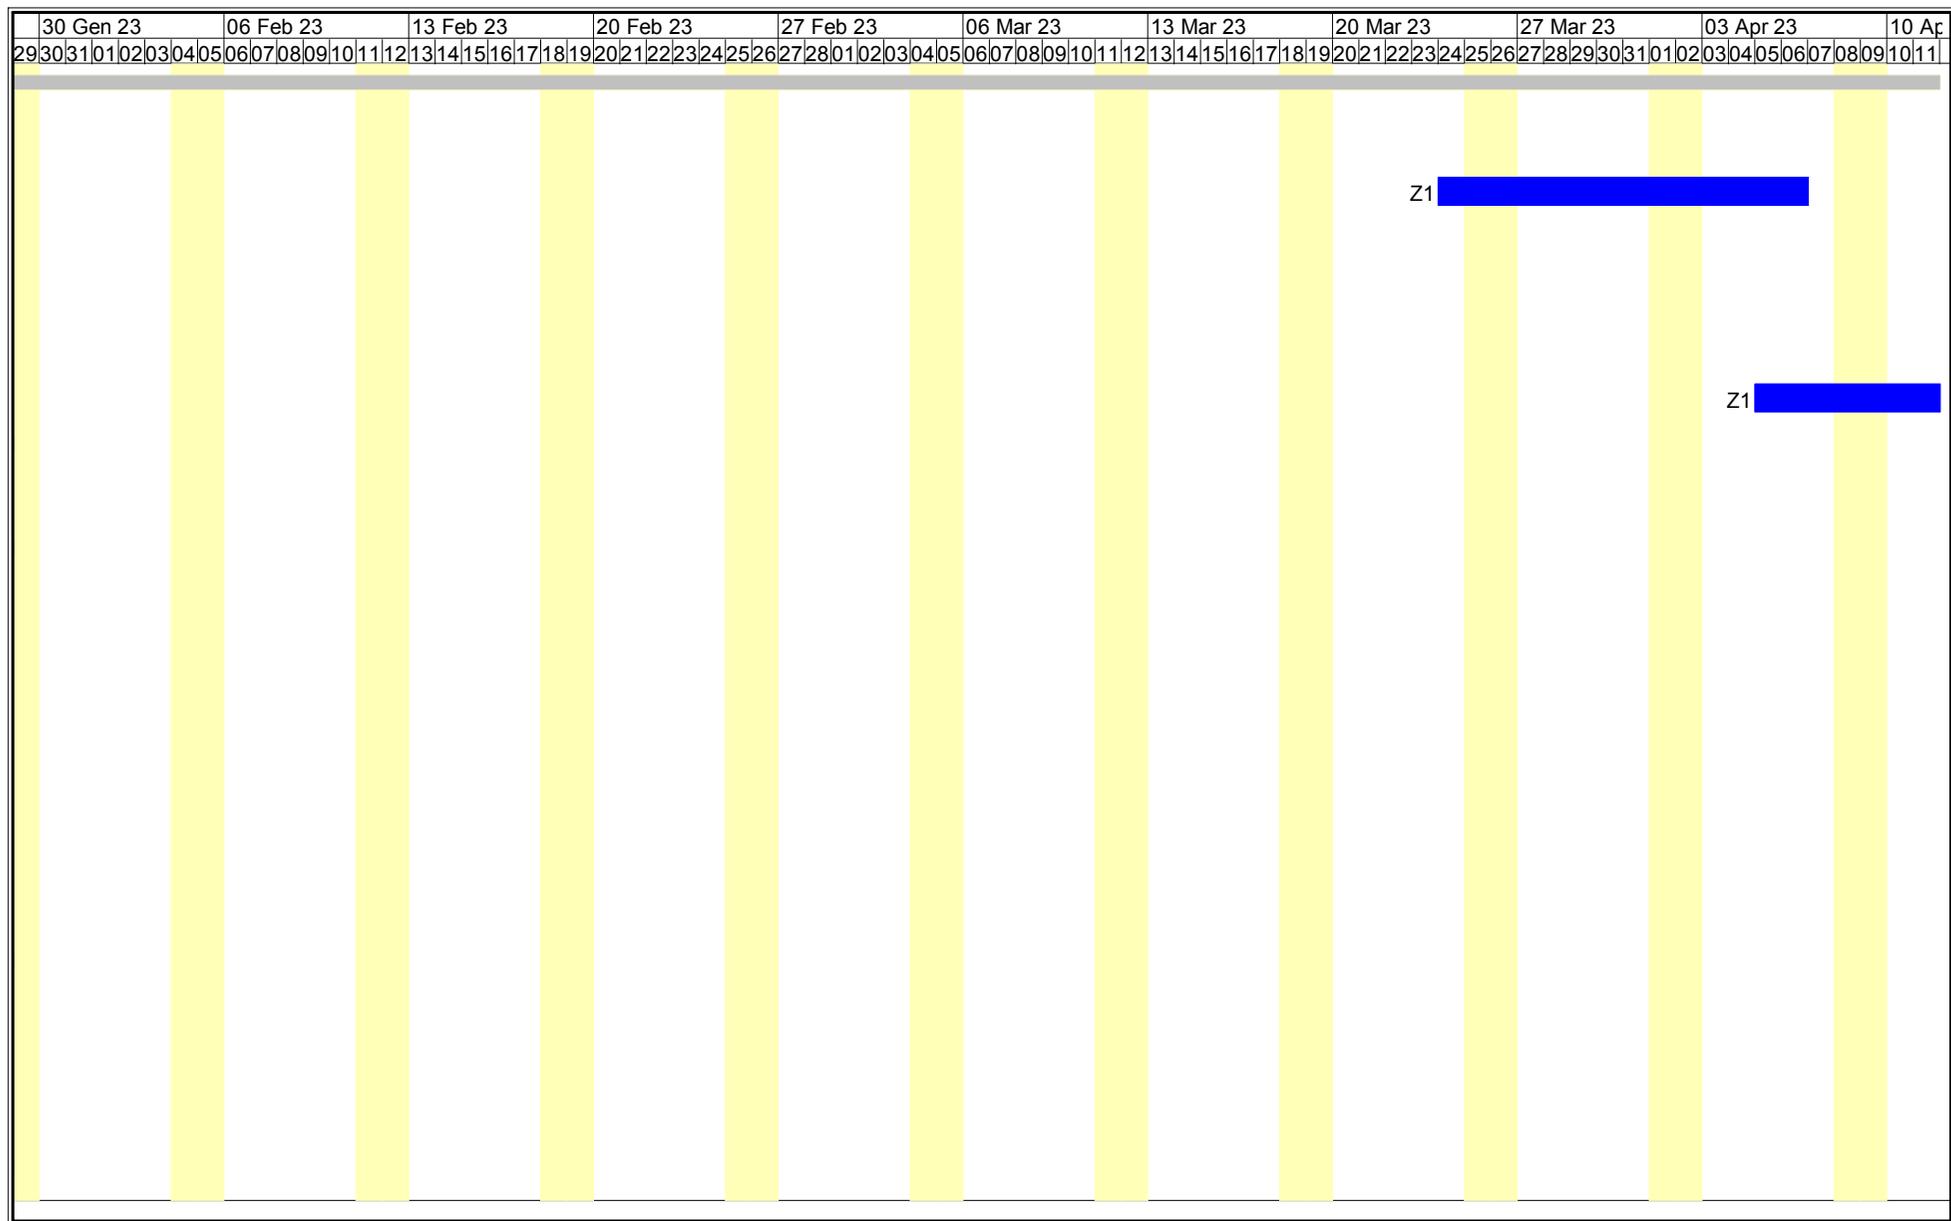

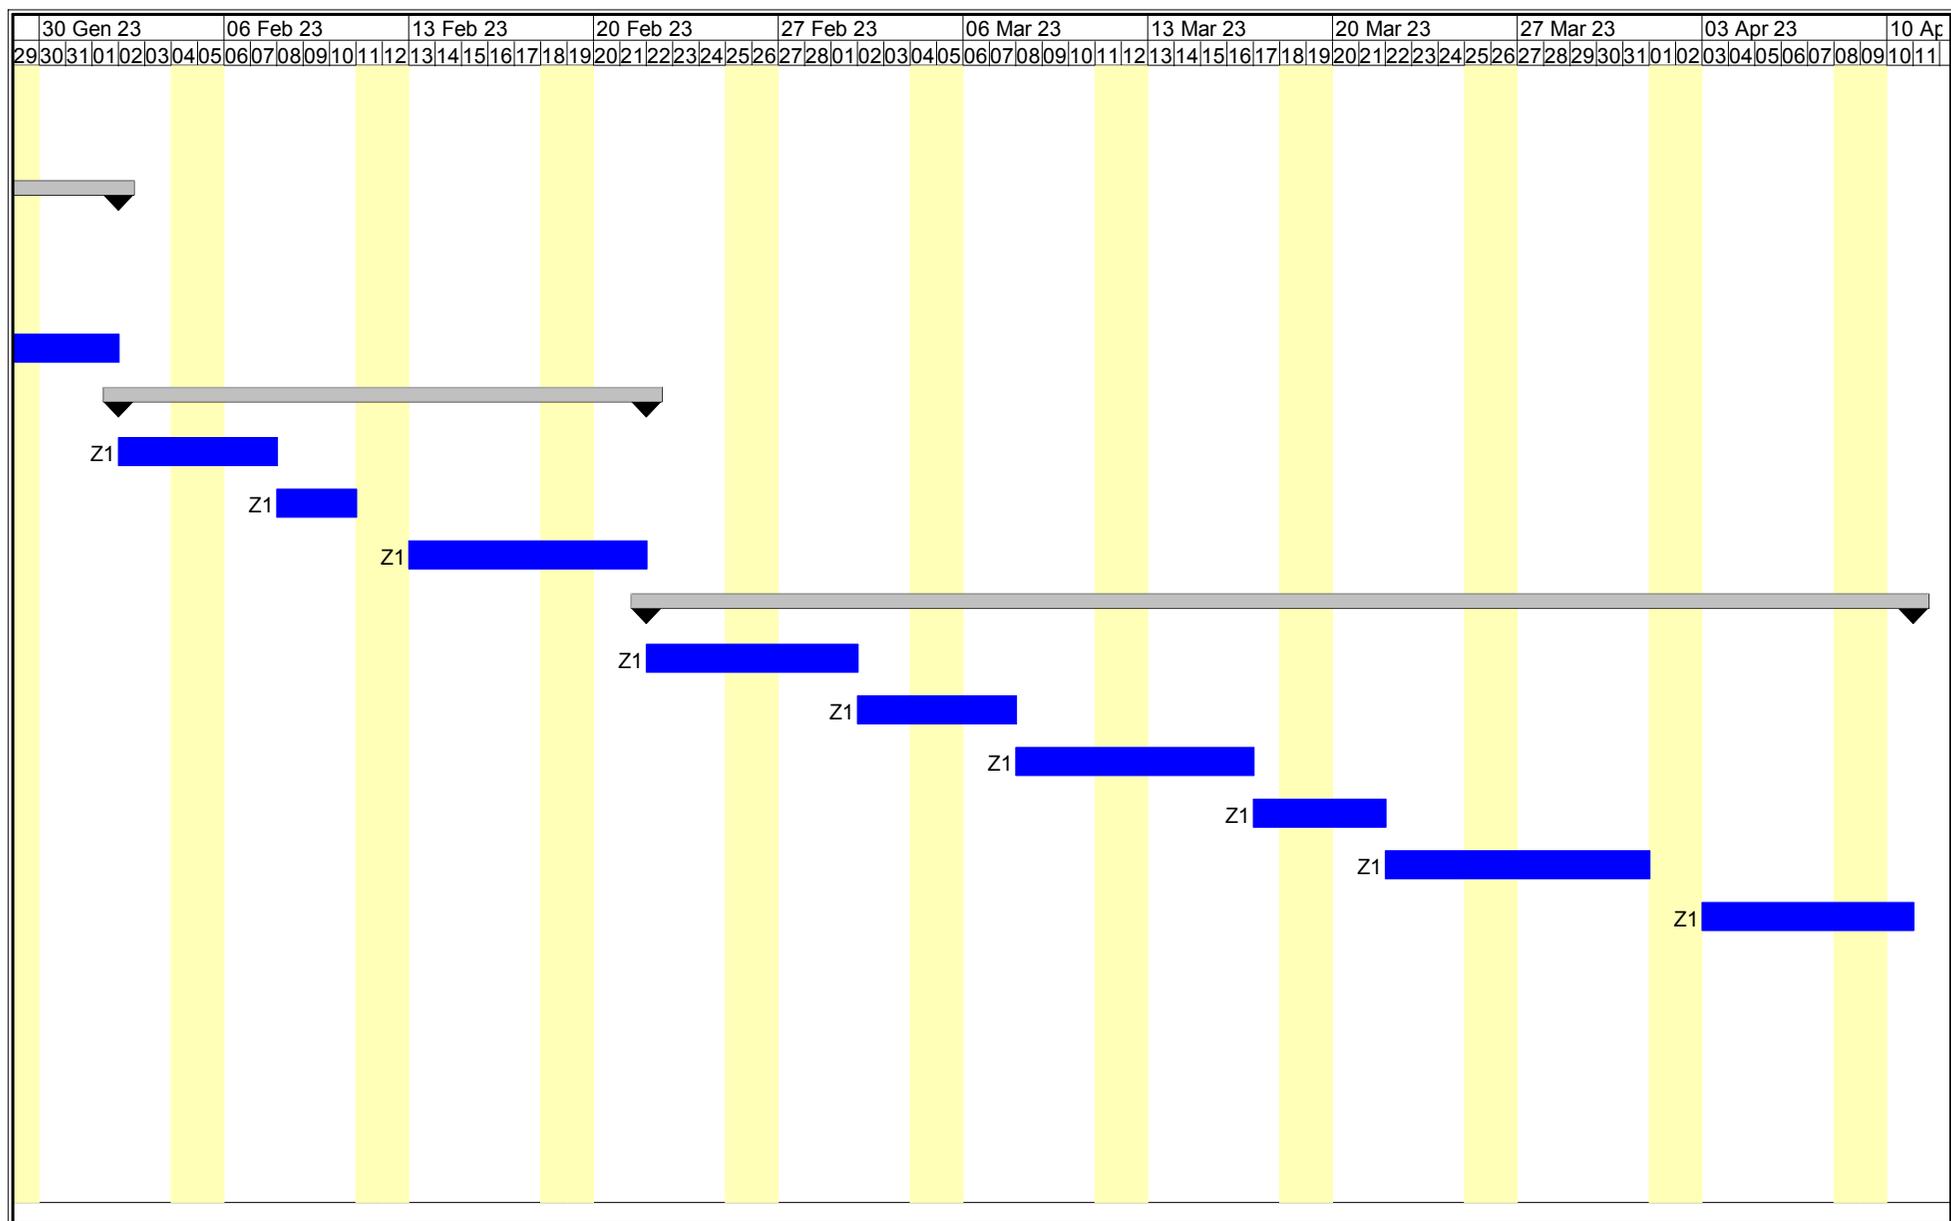

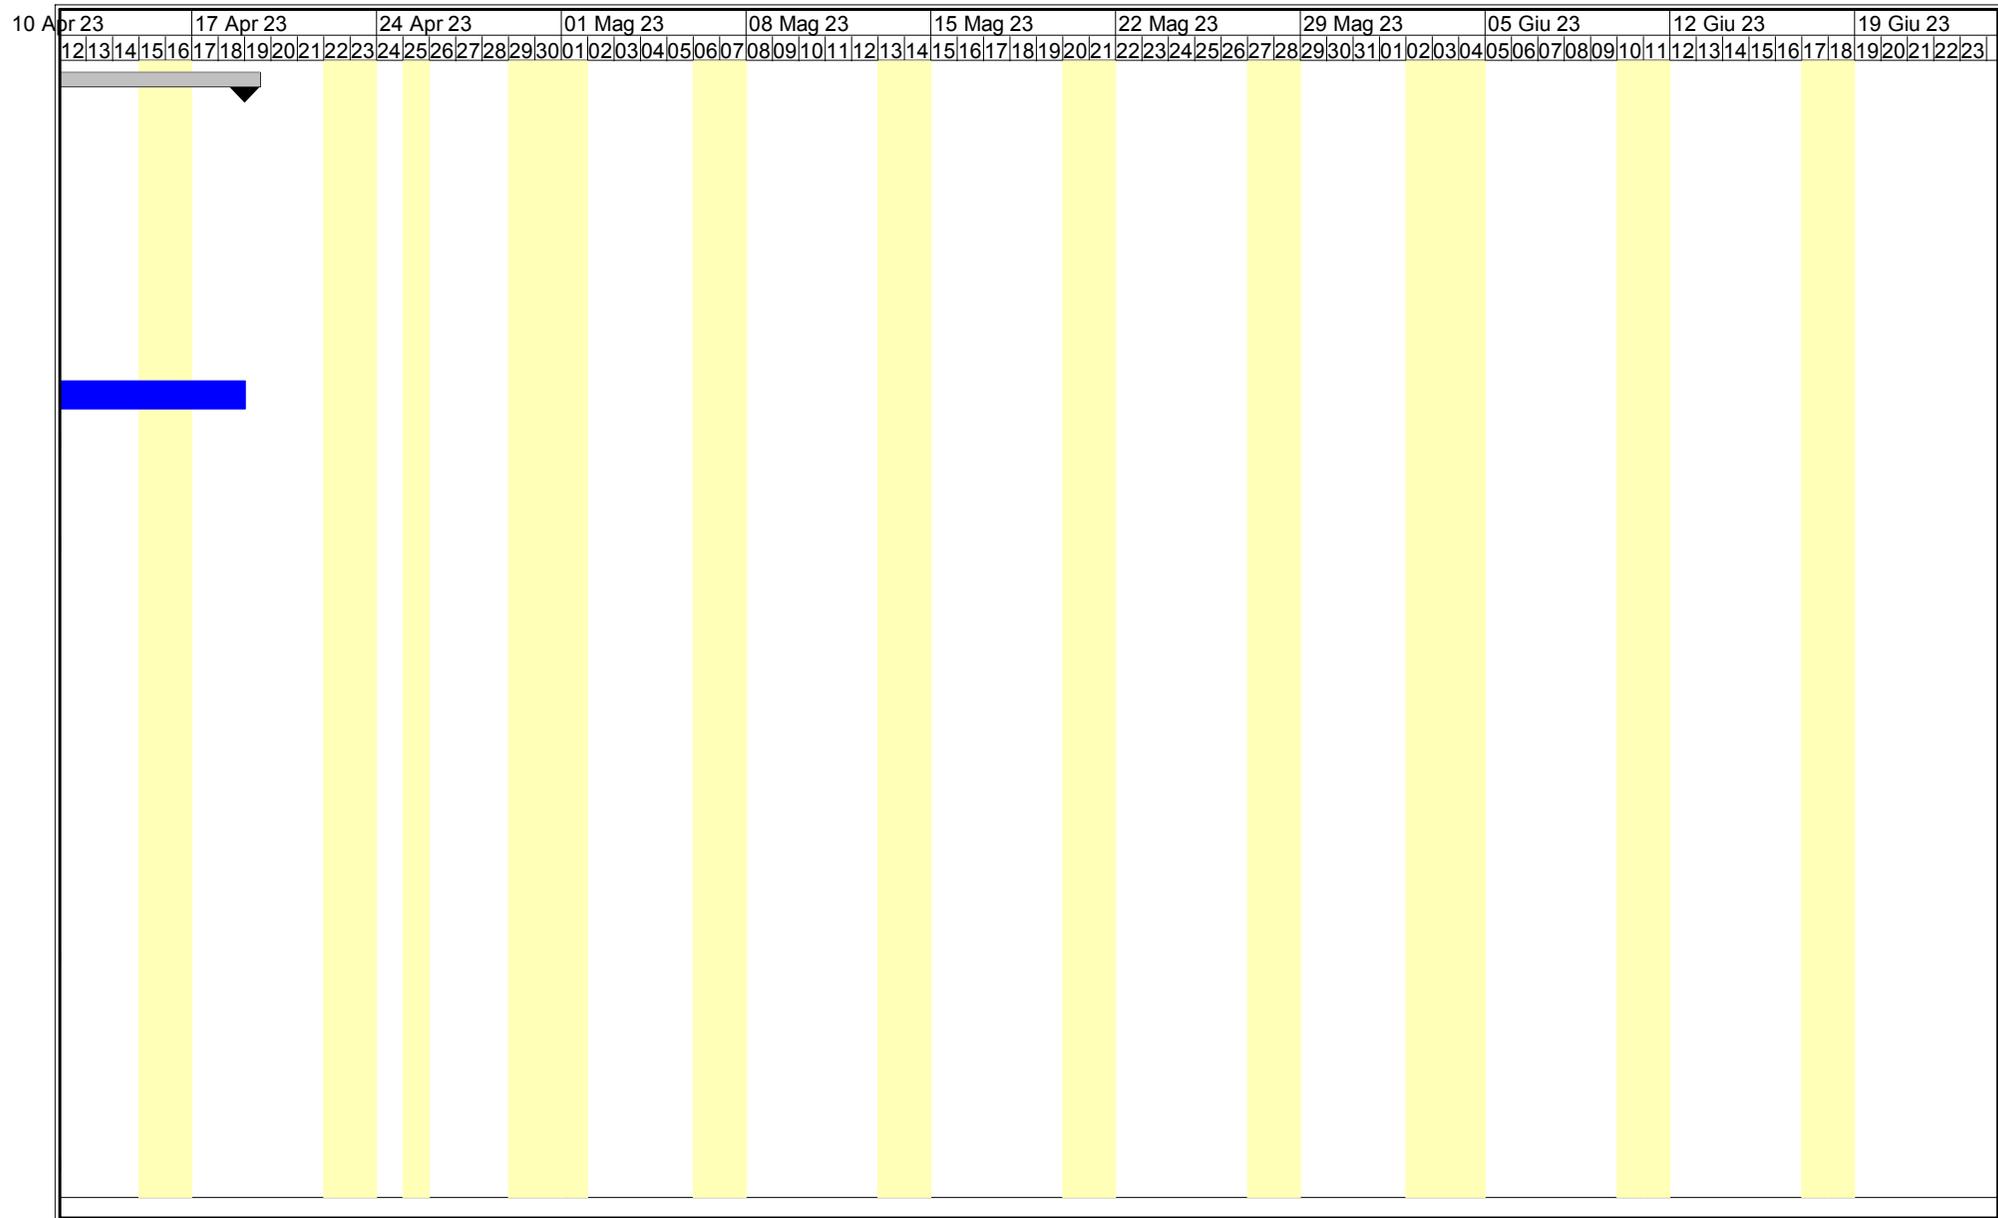

10 Apr 23	17 Apr 23	24 Apr 23	01 Mag 23	08 Mag 23	15 Mag 23	22 Mag 23	29 Mag 23	05 Giu 23	12 Giu 23	19 Giu 23																															
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
